

Sáng Kiến – Ý Tưởng

PVEP ATLAS


Advanced Technical Linkage & Accessment System

**Hệ thống quản lý chuỗi sản phẩm kỹ thuật và phụ thuộc liên
nhóm trong lĩnh vực địa chất – địa vật lý.**

15/06/2026

Bối cảnh & Thách thức trong dự án dịch vụ địa chất – địa vật lý

- Nhiều nhóm chuyên môn tham gia vào dự án.
- Sản phẩm của nhóm này là đầu vào của nhóm khác. Phụ thuộc lẫn nhau trong toàn bộ dự án.
- Mỗi nhóm thường tập trung vào hoàn thành công việc chuyên môn thiếu cái nhìn tổng thể về toàn bộ dự án.
- Các quyết định kỹ thuật sau mỗi giai đoạn trong cả dự án bị phân tán trong các email, MOM và khó để tìm lại sau khi dự án kết thúc.

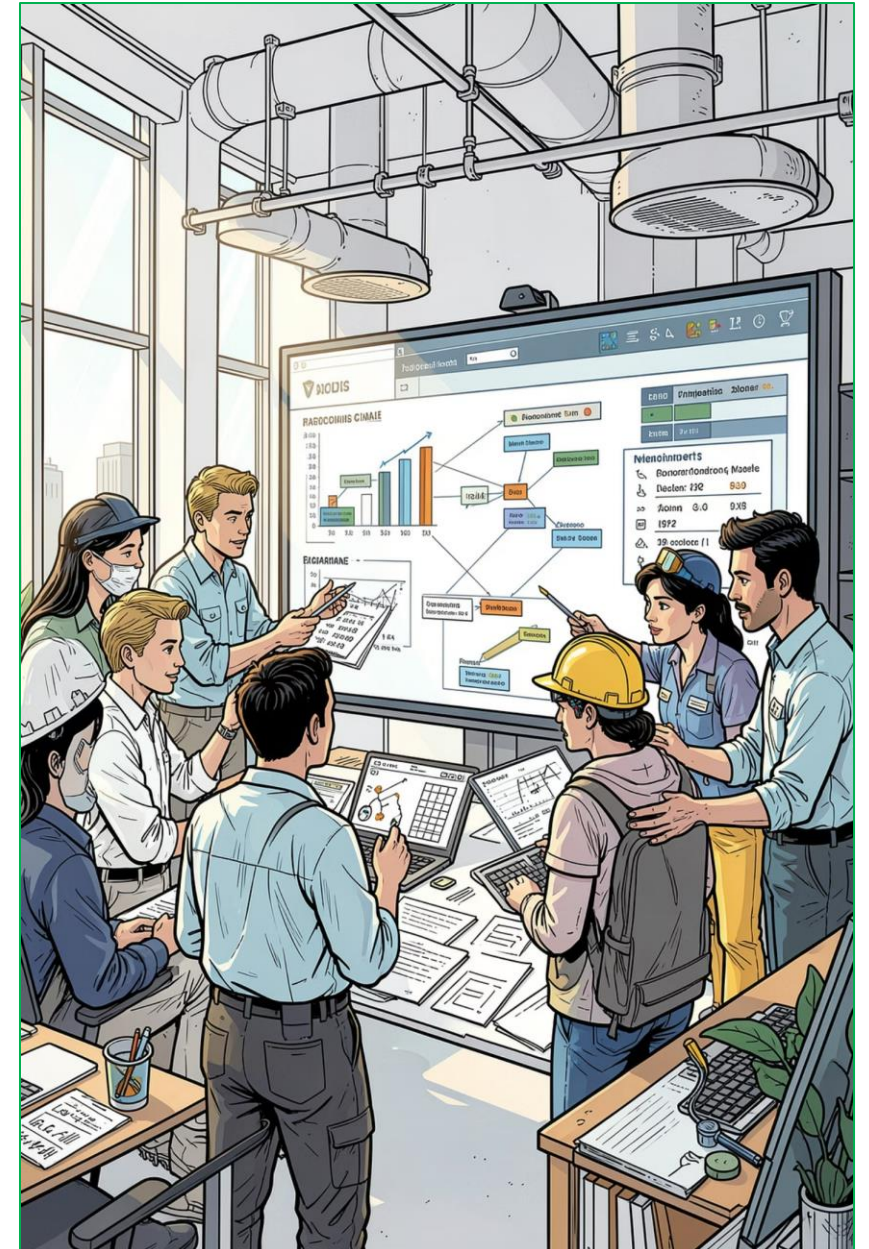


4 Vấn đề hiện tại


- Thiếu khả năng quan sát tổng thể của toàn dự án.
- Thiếu cái nhìn về các sản phẩm phụ thuộc liên nhóm.
- Khó đánh giá tác động tiến độ.
- Tri thức kỹ thuật phân tán.

Tác động thực tế:

Thiếu thông tin → phản ứng chậm → trễ hạn → làm lại → mất tri thức

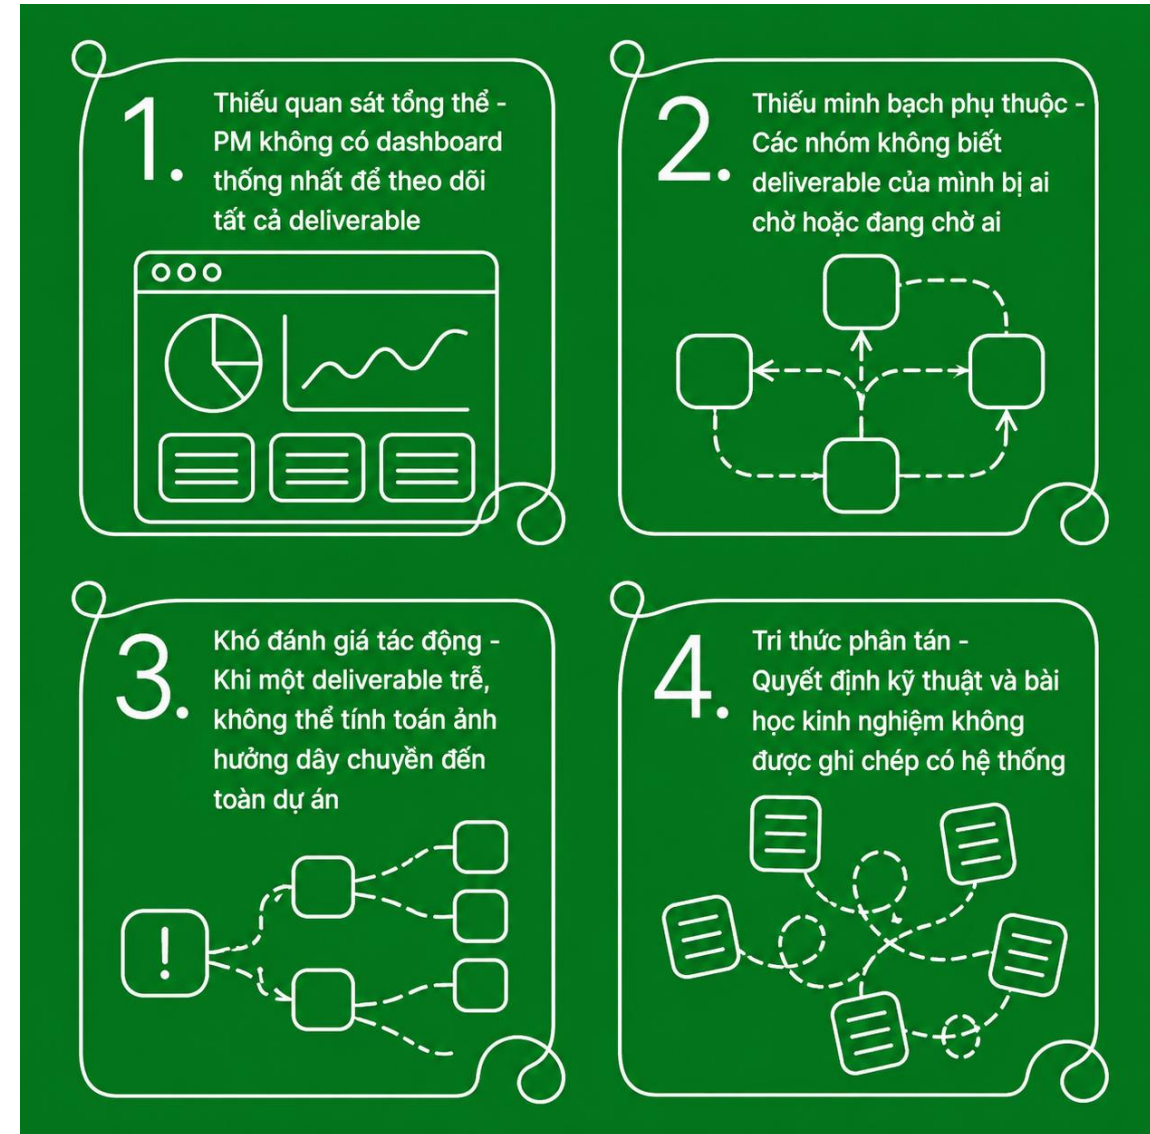

Thay đổi từ Task-based management sang Deliverable Management

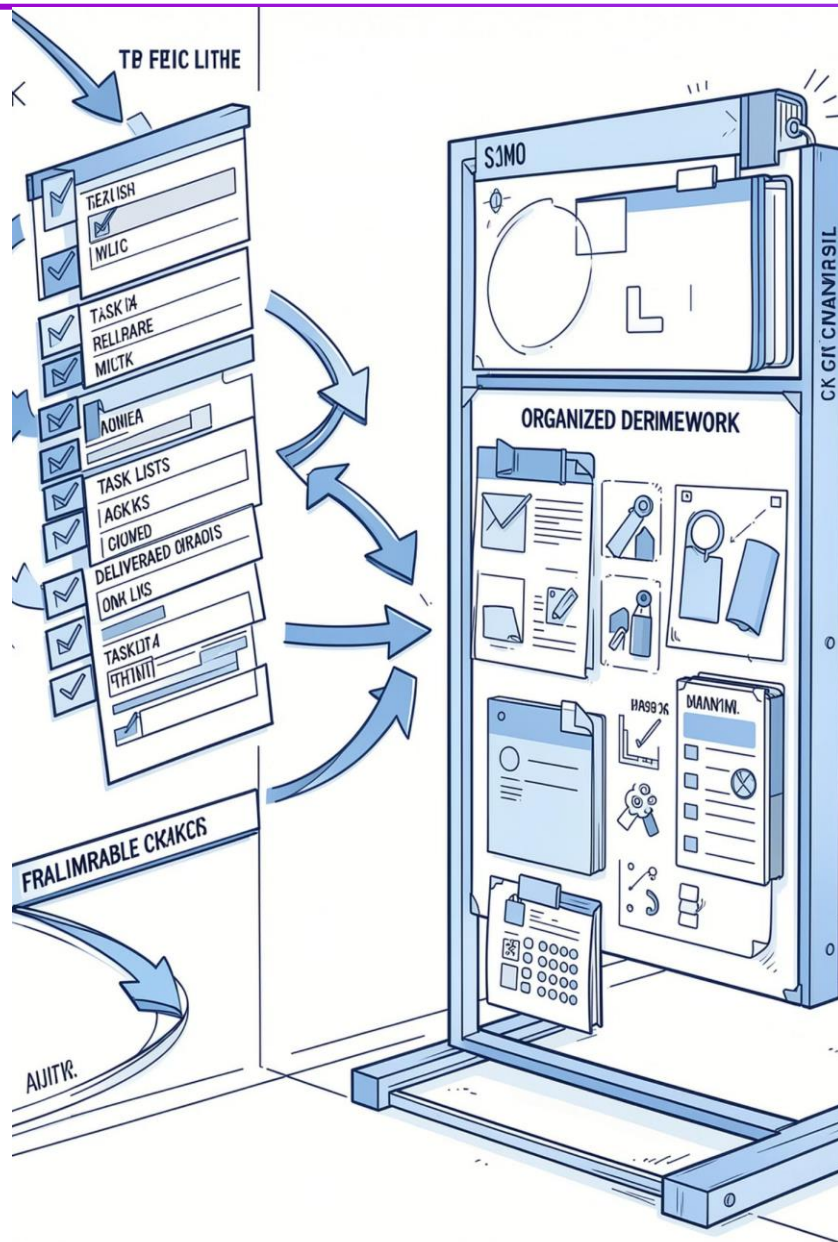


✗ Task-Based Management

- Quản lý theo đầu việc cá nhân
- Tập trung vào "đang làm gì"
- Khó thấy giá trị đầu ra thực sự
- Phụ thuộc bị ẩn trong danh sách task

✓ Deliverable-Based Management

- Quản lý theo sản phẩm kỹ thuật
- Tập trung vào "tạo ra cái gì"
- Rõ ràng đầu ra, chủ sở hữu, thời hạn
- Phụ thuộc được thể hiện trực quan

Xác định chuỗi sản phẩm cho toàn bộ dự án

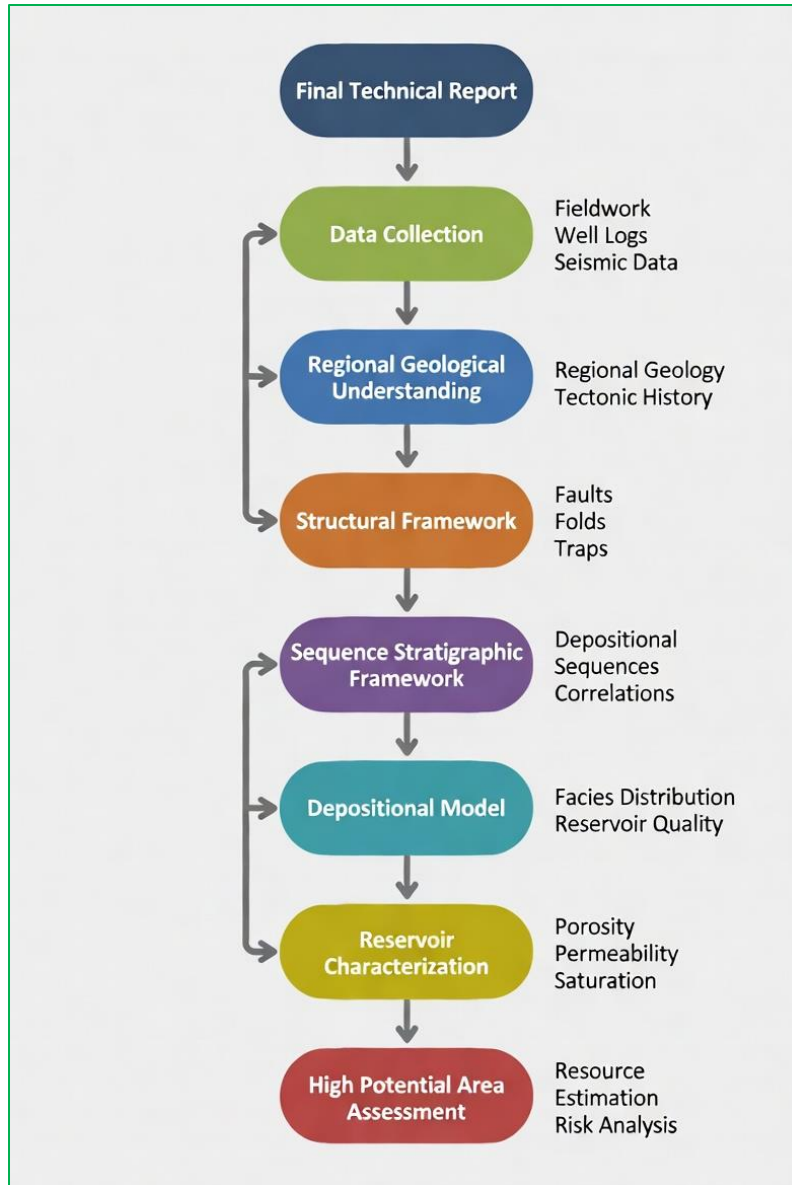

Mỗi sản phẩm đều có:

- Mã sản phẩm ID
- Owner
- Input
- Output
- Progress
- Status
- Version
- Influence Score
- Approval Authority

5 Module Chính



Project Overview

Tổng quan toàn bộ dự án: tiến độ, trạng thái deliverable, cảnh báo rủi ro.



Deliverable Flow

Hiển thị chuỗi deliverable theo thời gian thực với trạng thái hoàn thành.



Dependency Management

Quản lý và hiển thị phụ thuộc liên nhóm, liên deliverable.



Impact Analysis

Phân tích tác động dây chuyền khi deliverable bị chậm hoặc thay đổi.



Decision Store

Lưu trữ quyết định kỹ thuật, bài học kinh nghiệm và tri thức dự án.

Hiển thị tổng quan sức khỏe dự án với bốn chỉ số cốt lõi: Project Health, Overall Progress, Critical Deliverable và Expected Completion Date.

82%

Project Health

Critical Deliverable

Reservoir Characterization

68%


Overall Progress

Expected Completion

15-Aug-2026



Module 2: Deliverable Flow

Hiển thị toàn bộ chuỗi Deliverable với trạng thái trực quan, giúp nhận diện nhanh các hạng mục cần theo dõi.

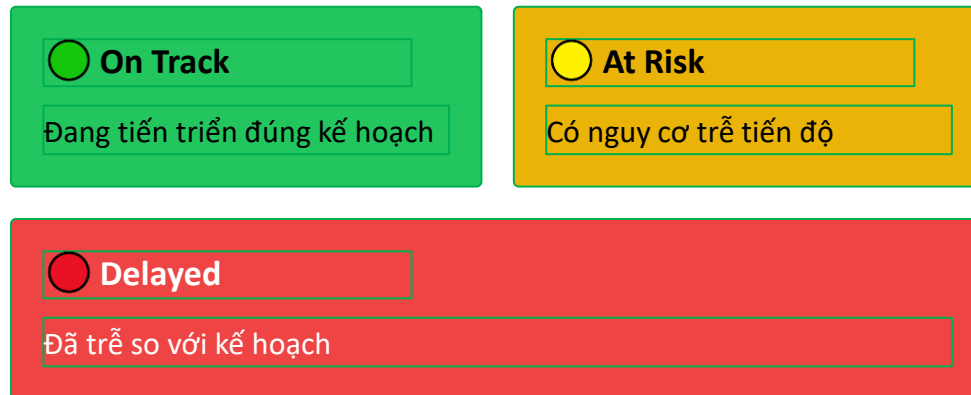

Technical Deliverables						Status	
	Mission	Status	Due Date	Assigned To	Assigned To		
1	Sedismic Data Processing	Status	22/4 25/16	On Track	On Track	On Track	On Track
1	Well Log Analysis	Status	10/4 FB	On Track	At Risk	At Risk	At Risk
1	Reservoir Modeling	Status	22/3 25/26	On Track	At Risk	At Risk	Delayed
1	Reservoir Modeling	Status	20/1 FB	On Track	At Risk	At Risk	At Risk
1	Reservoir Modeling	Status	12/4 FB	On Track	Delayed	At Risk	Delayed

Xác định và quản lý các công việc phụ thuộc lẫn nhau có ảnh hưởng đến tổng thể dự án

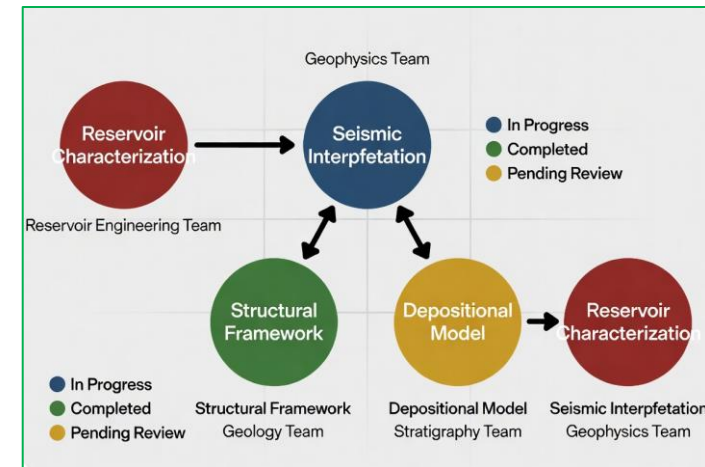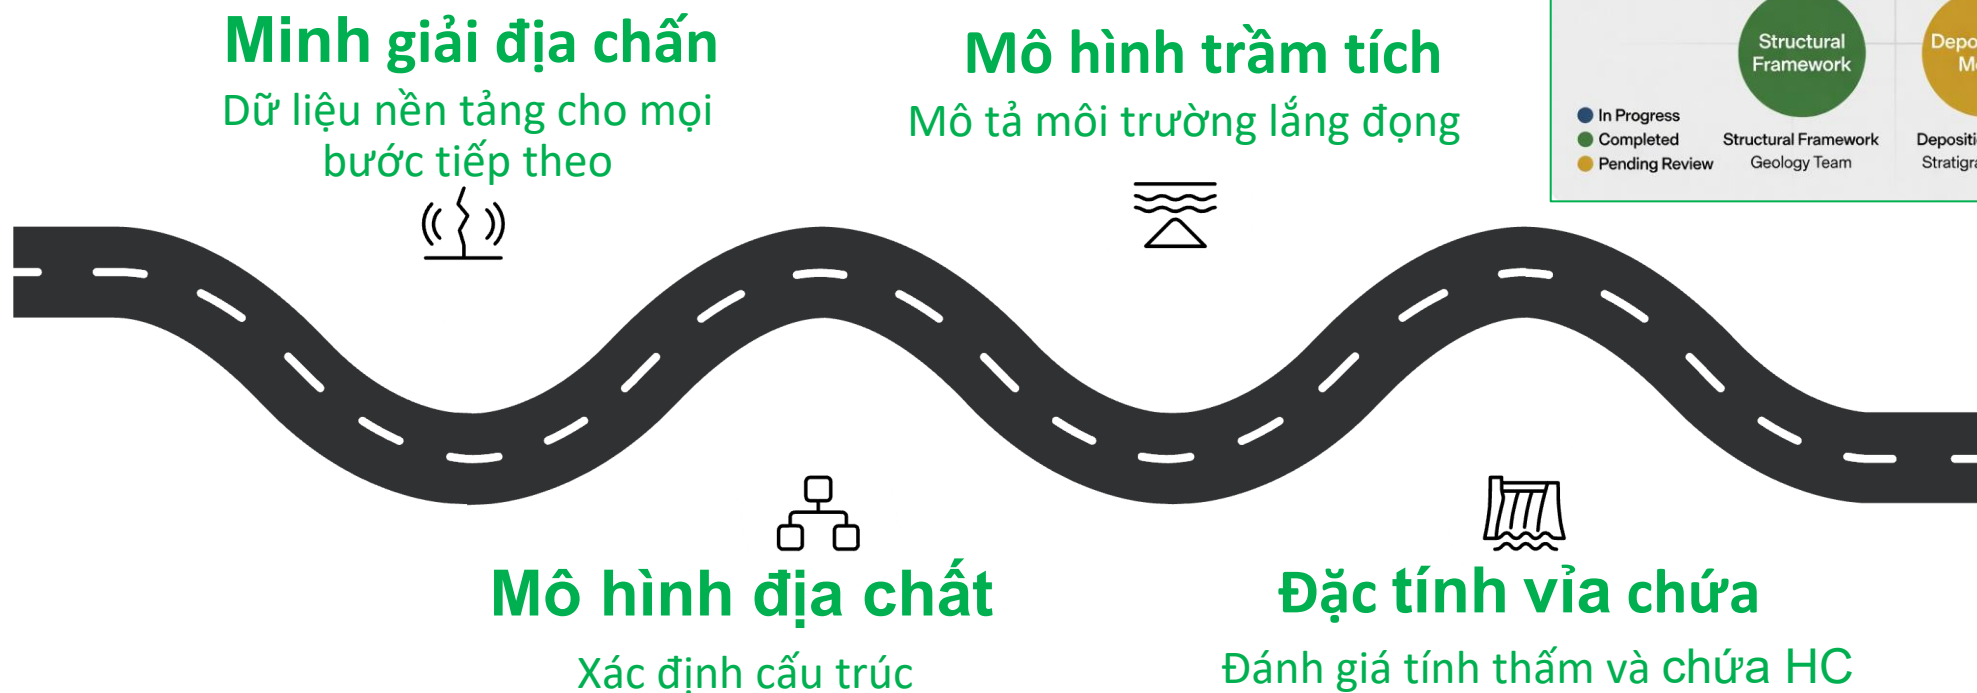

Chuỗi phụ thuộc trên cho thấy mỗi Deliverable là đầu vào của Deliverable tiếp theo. Bất kỳ trễ nào ở giai đoạn đầu sẽ lan truyền xuống toàn bộ chuỗi.

Khi một Deliverable bị trễ, hệ thống tự động xác định các Deliverable bị ảnh hưởng và tính toán mức độ trễ tiềm ẩn của toàn dự án. Giúp PM và lãnh đạo can thiệp sớm.

Ví dụ: Structural Framework chậm 7 ngày

Affected Deliverables:

- Sequence Framework
- Depositional Model
- Reservoir Characterization
- Prospect Assessment

Potential Project Delay

7 Days

Giúp PM và lãnh đạo can thiệp sớm.

Lưu trữ các quyết định kỹ thuật quan trọng.

Yêu cầu: mọi quyết định kỹ thuật phải được ghi nhận ngay trong cuộc họp trước khi kết thúc.



Ví dụ: TD-001

Decision ID TD-001

Topic E2 Boundary

Decision Regional Erosion Surface

Evidence Onlap Truncation, Regional Correlation

Approved By Seismic Lead

Date 12-Jun-2026

Hệ thống hoạt động theo luồng thông tin từ kỹ thuật viên đến ban lãnh đạo, đảm bảo dữ liệu chính xác và cập nhật theo thời gian thực.



Engineer

Cập nhật tiến độ deliverable



Technical Owner

Phê duyệt chất lượng kỹ thuật



Project Secretary

Đồng bộ dữ liệu hệ thống



PM

Giám sát & ra quyết định



Dashboard

Hiển thị thời gian thực

 Mỗi vai trò có trách nhiệm rõ ràng — đảm bảo dữ liệu trên hệ thống luôn phản ánh đúng thực tế dự án.

Lợi ích & Kết luận



Giảm thời gian chờ

Phụ thuộc được nhìn thấy sớm, giảm thời gian chết giữa các nhóm

Giảm làm lại

Quyết định được ghi chép, bài học được chia sẻ xuyên suốt tổ chức

Giảm trễ hạn

Cảnh báo sớm và phân tích tác động giúp PM hành động trước khi quá muộn

Xây dựng tri thức

Decision Repository trở thành tài sản tri thức kỹ thuật lâu dài của công ty

**Mong nhận được nhận xét & góp ý
từ P.TGD để hoàn thiện ý tưởng!**
